

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Barra do Garças – AGERBARRA

RELATÓRIO DE VISITA

Município: Barra do Garças/MT

Assunto: Obra de implantação de rede de abastecimento de
água

GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO - GFO

AGOSTO / 2023

1. DA AÇÃO DE VISTORIA

A equipe de fiscalização da AGERBARRA vistoriou as etapas da obra de implantação de rede de água para melhoria no abastecimento de vários bairros e loteamentos na região do Recanto das Acácias, no intuito de verificar a qualidade dos serviços.

2. DA ANÁLISE DOS FATOS

A concessionária Águas de Barra do Garças foi notificada no dia 13 de setembro de 2022 para solucionar o problema de desabastecimento de água no Condomínio Park da Serra, identificado pelo monitoramento de pressão realizado pela AGERBARRA, nesta localidade.

No dia 07 de outubro de 2022 a concessionária se manifestou com um cronograma das obras de melhorias no sistema de abastecimento, incluindo a elaboração do projeto, o processo de contratação, até chegar na interligação e testes, num total de 231 dias. Neste momento, a concessionária apresentou a intenção de implantar um reservatório na região.

Desta feita, no dia 11 de novembro de 2022, foi assinado um Termo de Compromisso (TC) entre as partes, no intuito de garantir a execução das obras dentro do prazo, e o não cumprimento com aplicação imediata de multa.

Já no dia 06 de junho de 2023, assinou-se um Termo Aditivo e Modificativo (TAM) ao TC, com objetivo de alterar a implantação do reservatório por uma rede de distribuição de água, com o mesmo prazo de finalização, que foi até o dia 31 de agosto de 2023.

Esta alteração, além da melhoria no abastecimento de água, traz a possibilidade de realização da setorização da região supracitada.

Após o início da obra da implantação dos 2.400 metros da rede de abastecimento de água, saindo do Reservatório do BNH, a equipe de fiscalização da AGERBARRA realizou várias vistorias, conforme imagens a seguir:



Imagem 01: Detalhe do início da obra com abertura da vala.

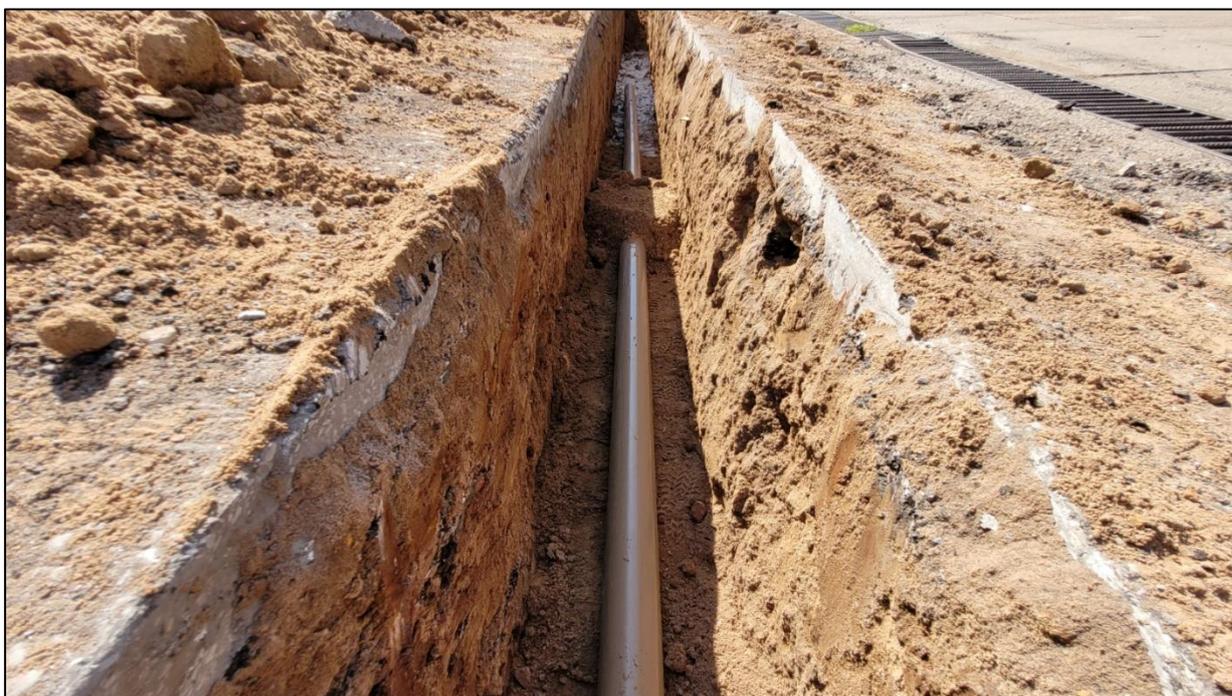


Imagem 02: Detalhe da implantação da canalização.



Imagem 03: Detalhe da interligação da nova rede na saída do reservatório do BNH.

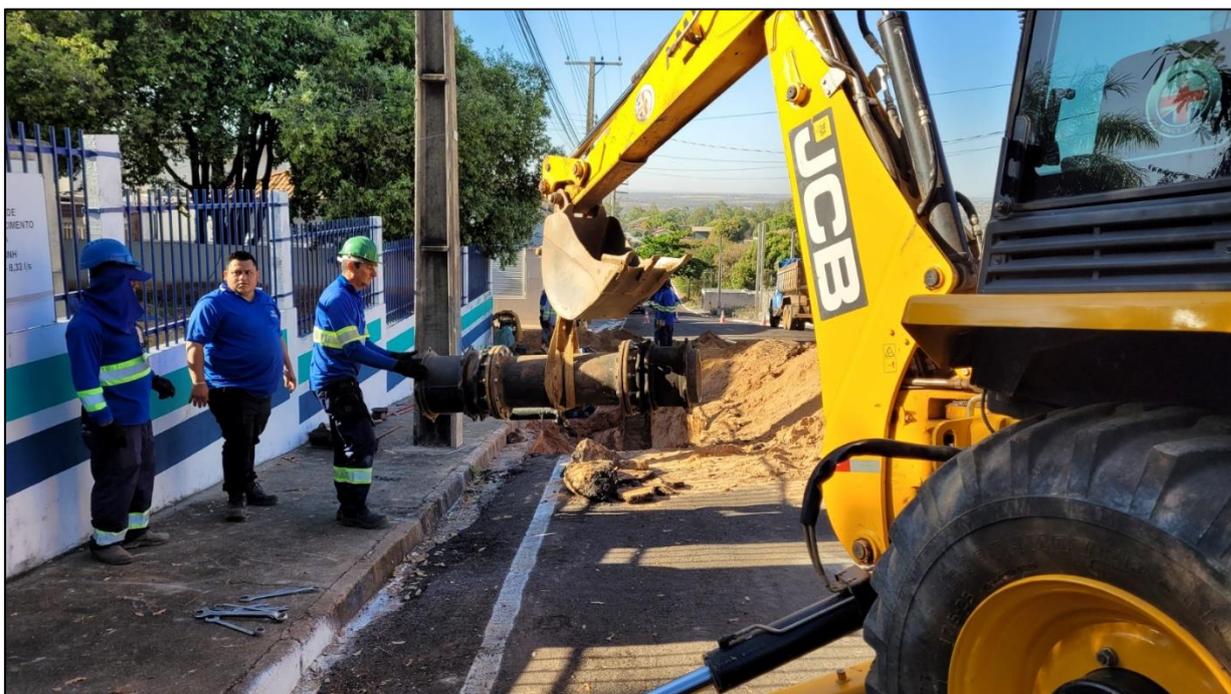


Imagem 04: Detalhe da interligação da nova rede na saída do reservatório do BNH.



Imagem 05: Detalhe da preparação do solo para a compactação.



Imagem 06: Detalhe da compactação do solo.



Imagem 07: Detalhe da limpeza da vala para imprimação.



Imagem 08: Detalhe do solo preparado para a imprimação.



Imagem 09: Detalhe do solo preparado para a imprimação.



Imagem 10: Detalhe da imprimação.



Imagem 11: Detalhe da altura do solo para receber o asfalto.



Imagem 12: Detalhe da trena na medição da altura.



Imagem 13: Detalhe da marcação para o recorte do asfalto.



Imagem 14: Detalhe do recorte do asfalto para evitar infiltrações.



Imagem 15: Detalhe do trecho com a repavimentação asfáltica concluída



Imagem 16: Detalhe do trecho com a repavimentação asfáltica concluída.

3. CONCLUSÃO

Por todo exposto, conclui-se que a obra de implantação da rede de água, para a melhoria no abastecimento da região supracitada, está ocorrendo de forma satisfatória.

Foram realizadas as seguintes etapas: de construção das valas, de implantação das tubulações, de compactação e limpeza do solo, de recorte das partes irregulares, de imprimação e, por fim de repavimentação asfáltica.

A equipe de fiscalização continuará as vistorias até o término da obra e, posteriormente, monitorando a qualidade dos serviços, visto que, se algum trecho for identificado a necessidade de retrabalho, a AGERBARRA notificará a concessionária para os devidos reparos.

4. EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

- Danilo Santos Lobato e Dayane Vieira Lobato – Assessores de Fiscalização;
- Glauber Aparecido Alves Moura – Coordenador de Saneamento / Especialista em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico;
- Reuber Bonfim Oliveira – Gerente de Fiscalização e Operação / Especialista em Saneamento Ambiental.
